MĚSTSKÝ ÚŘAD HORAŽĎOVICE
Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice
Odbor dopravy

Naše č.j.: MH/12617/2024
Spisová značka: MH/12265/2024-279.3

Vyřizuje: Milada Kotišová
Telefon: 371 430 566
E-mail: kotisova@muhorazdovice.cz

Datum: 18.07.2024

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
-
STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍ KOMUNIKACI

Městský úřad Horažďovice, odbor dopravy, jako věcně a místně příslušný správní orgán podle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů,

stanoví

v souladu s ustanovením § 77 odst. 1) písm. c) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, po předchozím písemném vyjádření Policie ČR, KŘPP, ÚO Klatovy, DI ze dne 18.07.2024, pod č.j. KRPP-37230/ČJ-2024-030406 přechodnou úpravu provozu na silnici III/1869 a na místních komunikacích v obci Myslív, v úsecích dle doložené situace.

Žadatel:
VAK SERVIS s.r.o., Domažlické předměstí 610, 339 01 Klatovy

Stanovené dopravní značení a zařízení:
- dopravní značení a zařízení bude umístěno dle odsouhlaseného DIO, které je nedílnou součástí tohoto opatření.

Důvod stanovení přechodné úpravy provozu:
- zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu při úplné a částečné uzavírce provozu na silnici III/1869 v obci Myslív, v úseku dle doložené situace, z důvodu realizace stavby s názvem „Myslív splašková kanalizace a ČOV".

Platnost stanovené přechodné úpravy provozu (předpokládaný termín dle žádosti):
- I. ETAPA: úsek mezi čp. 73 a č.e. 10 v délce cca 60 m: termín = od 22.07.2024 do 07.08.2024
- II. ETAPA: úsek mezi čp. 45 a čp. 34 v délce cca 100 m: termín = od 08.08.2024 do 31.08.2024

Další podmínky k provedení přechodné úpravy provozu:
1.) Veškeré dopravní značky musí svým provedením odpovídat příslušným ustanovením zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů v návaznosti na vyhlášku č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, na související předpisy a na platné ČSN.

2.) Při osazování přenosného dopravního značení a zařízení bude postupováno v souladu s TP-66 (Zásady pro označování pracovních míst na pozemní komunikaci) a TP-65 (Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích).
3.) Přenosné dopravní značky budou umístěny spodním okrajem ve výšce nejméně 0,60 m nad úrovní vozovky.
4.) Použité dopravní značky budou provedeny výhradně jako retroreflexní třídy minimálně 1 dle platné ČSN a budou osazeny buď na podpěrných sloupcích opatřených nátěrem se střídavě červeno-bílými pruhy šířky 0,10 – 0,20 m. Délka barevné úpravy bude min. 0,45 m. Podpěrné sloupky budou uchyceny v podkladních deskách.
5.) Neplatnost stávajících dopravních značek, která vyplývá v navržené přechodné úpravy provozu, musí být vyjádřena způsobem odpovídajícím ust. § 3 odst. 8 vyhl. č. 294/2015, kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích.
6.) V době po zprůjezdnění uzavřených pozemních komunikací až do doby finální opravy povrchu po výkopových pracích musí být úseky ze všech směrů označeny dopravní značkou A 7a („Nerovnost vozovky“).

Odůvodnění:
Městský úřad Horažďovice, odbor dopravy, obdržel dne 11.07.2024 žádost právnické osoby VAK SERVIS s.r.o., se sídlem Domažlické předměstí 610, 339 01 Klatovy, o stanovení přechodné úpravy provozu na silnici III/1869 a na místních komunikacích v obci Myslív, v úsecích dle doložené situace, z důvodu realizace stavby s názvem „Myslív splašková kanalizace a ČOV“.

Žádost byla doložena těmito podklady:
- návrh stanovení přechodné úpravy provozu:
  • grafická část – DIO
- vyjádření Policie ČR, KŘPP, ÚO Klatovy, DI, č.j.: KRPP-37230/ČJ-2024-030406

Městský úřad Horažďovice, odbor dopravy posoudil předložený návrh přechodné úpravy provozu na silnici III/1869 a na místních komunikacích v obci Myslív, v úsecích dle doložené situace, a jelikož byly splněny zákonem požadované podmínky pro stanovení přechodné úpravy provozu, dospěl k závěru, že vydá toto opatření obecné povahy.

Poučení:
Podle § 173 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek.

Opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky

Milada Kotišová
pověřená vedením odboru dopravy

Příloha:
- odsouhlasené DIO (2xA4)

Městský úřad Horažďovice zajistí vyvěšení této vyhlášky na úřední desce městského úřadu po dobu 15 dnů a zároveň zajistí její zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Obecní úřad Myslív zajistí vyvěšení této vyhlášky na úřední desce městského úřadu po dobu 15 dnů

Vyvěšeno dne: **Sejmuto dne:**

Obdrží:
VAK SERVIS s.r.o., Domažlické předměstí 610, 339 01 Klatovy
Policie ČR, KŘPP, ÚO Klatovy, DI, Nábřeží kpt. Nálepky 412, 339 01 Klatovy
Městský úřad Horažďovice, Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice - k vyvěšení
Obecní úřad Myslív, Myslív 52, 341 01 Horažďovice – k vyvěšení

STAVBA: MYSLÍV SPLAŠKOVÁ KANALIZACE A ČOV

NÁVRH PŘECHODNÉHO DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ

UZAVÍRKA SILNICE III.tř./1869 - I.ETAPA

V této etapě výstavby dojde k výstavbě části stoky S2-2 a to pouze v úseku silnice III.tř. /1869 dle vyznačeného prostoru v situaci v obci Myslív.
Bude provedena úplná uzavírka této části místní komunikace, po jednotlivých pracovních místech.
Dopravní značení je navrženo dle TP66, schéma B/15 + vyznačení objízdné trasy.

Vyznačení pracovního místa osazením značek B1 s dodatkovou tabulí "Mimo vozidel stavby", Z02.
Vyznačení objížďky pomocí značek IS11c, C3b. Objížďka bude vedena nejbližšími okolními ulicemi. V části osazena značka B30.
V nejbližších křižovatkách budou osazeny značky IP10a, IP10b, IP10C.
Úplná uzavírka, včetně délky trvání bude předem nahlášena IZS, včetně objízdné trasy.

Termín zvláštního užívání dle žádosti:

- úsek mezi čp. 73 a č.e. 10 v délce cca 60 m: termín = od 22.07.2024 do 07.08.2024

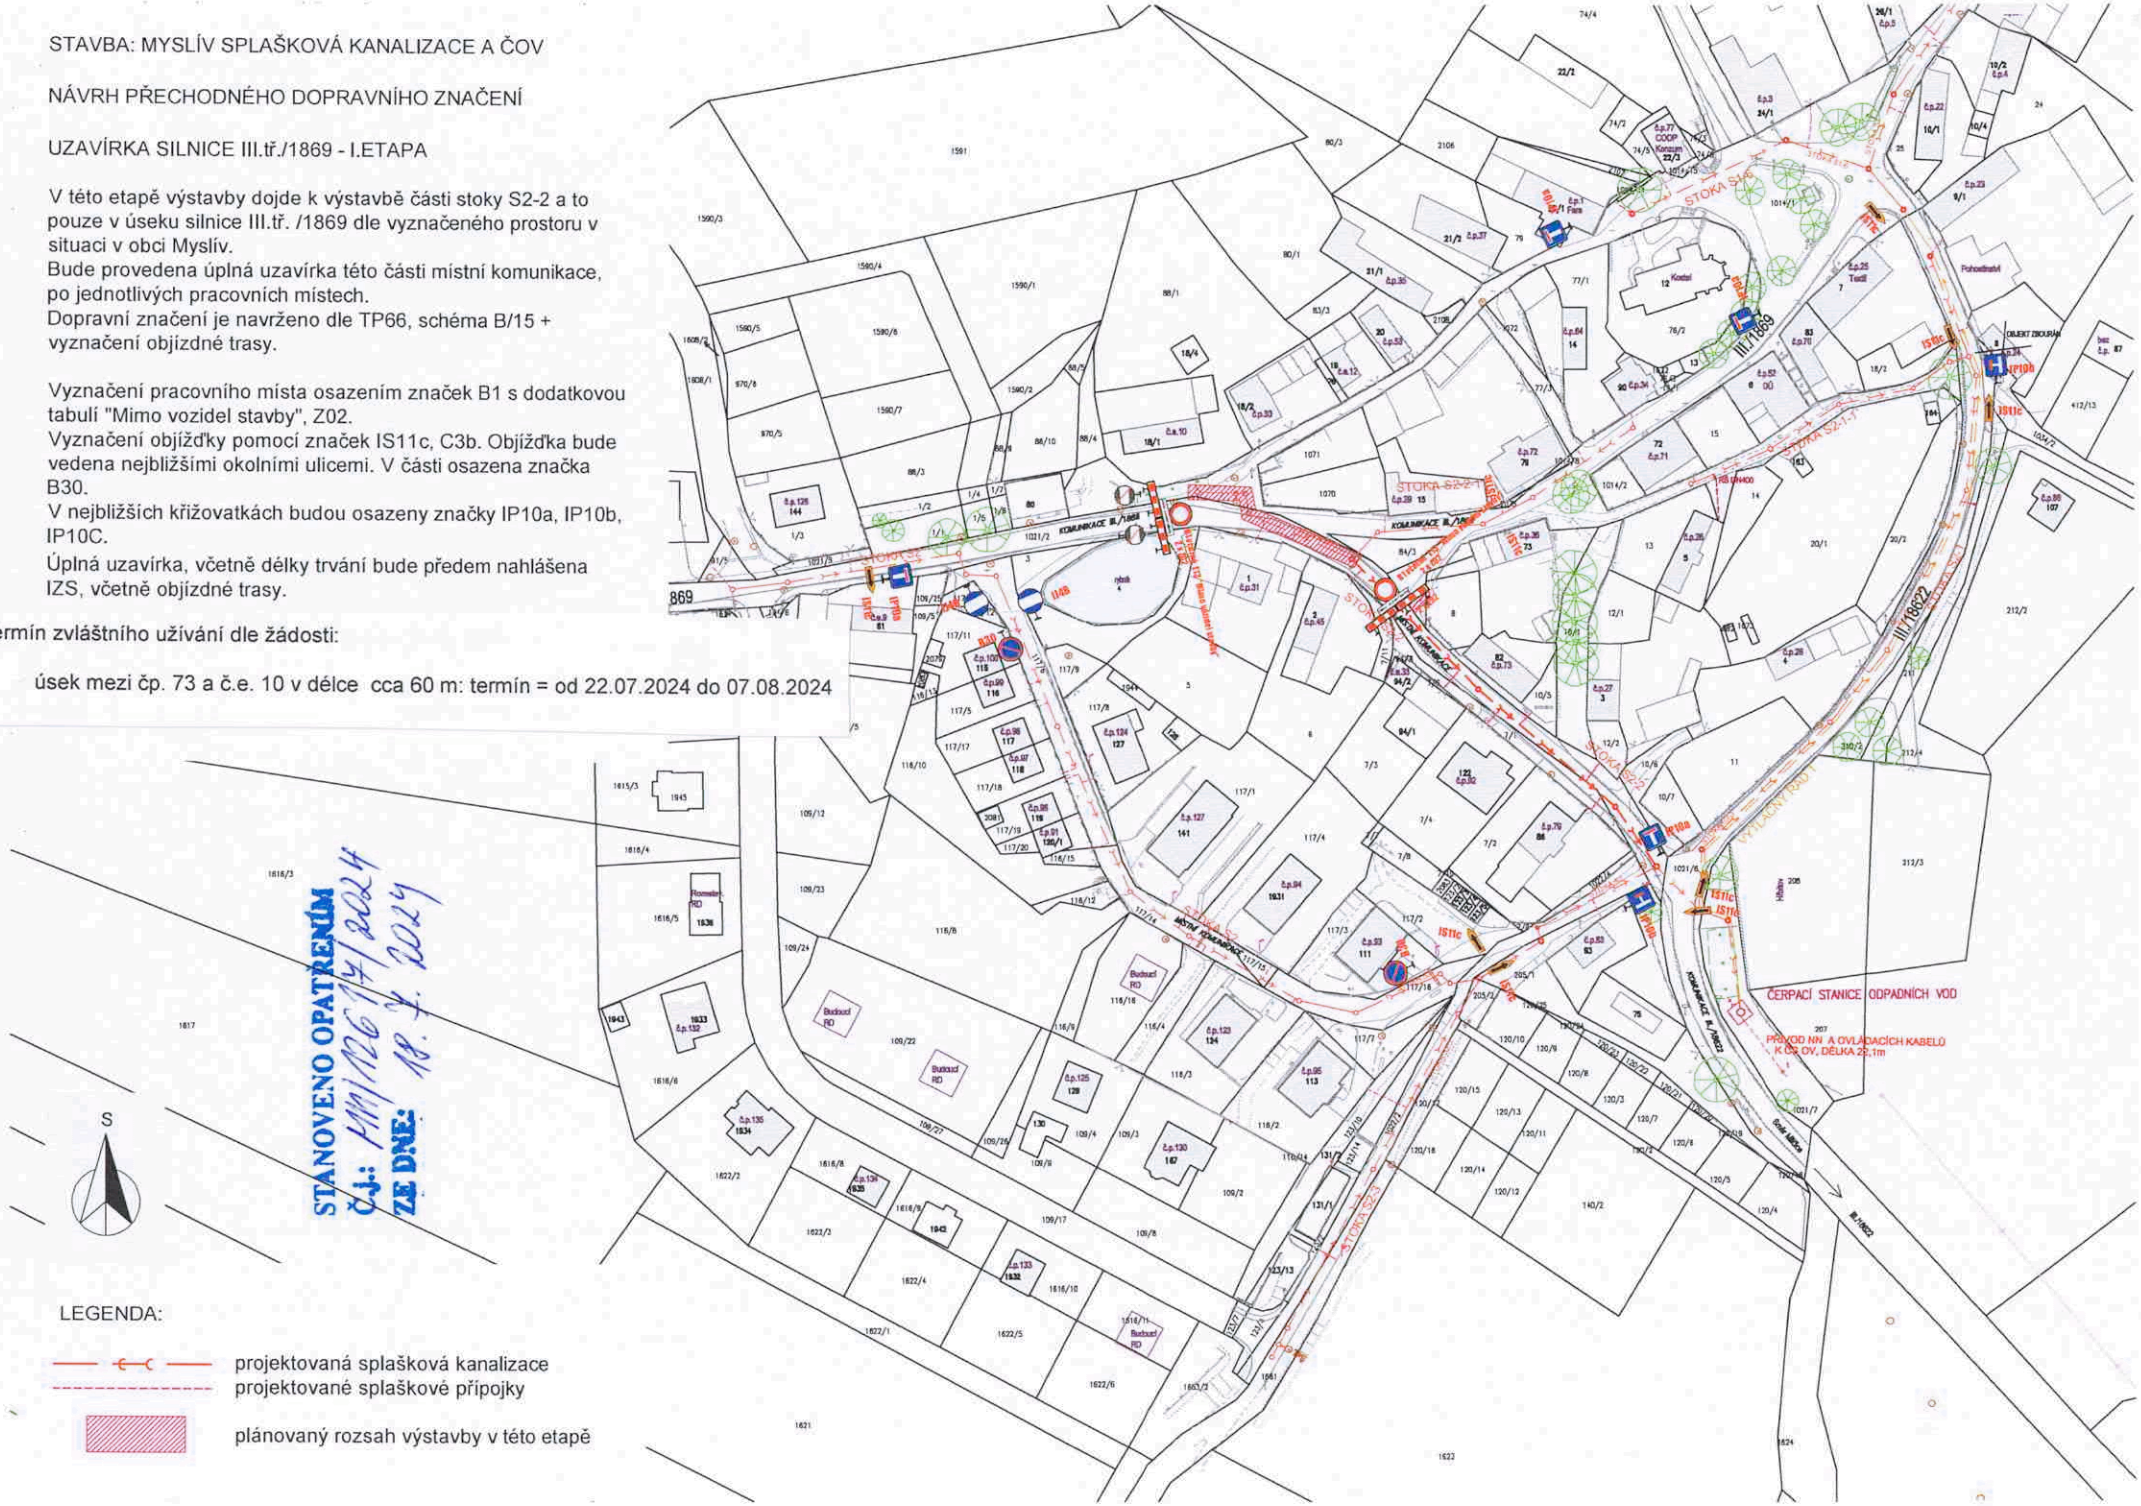

LEGENDA:

projektovaná splašková kanalizace
projektované splaškové přípojky

plánovaný rozsah výstavby v této etapě

STAVBA: MYSLÍV SPLAŠKOVÁ KANALIZACE A ČOV

NÁVRH PŘECHODNÉHO DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ

UZAVÍRKA SILNICE III.tř./1869 - II.ETAPA

V této etapě výstavby dojde k výstavbě stoky S2-2-1 v úseku silnice III.tř. /1869 dle vyznačeného prostoru v situaci v obci Myslív.
Bude provedena úplná uzavírka této části místní komunikace, po jednotlivých pracovních místech.
Dopravní značení je navrženo dle TP66, schéma B/15 + vyznačení objízdné trasy.

Vyznačení pracovního místa osazením značek B1 s dodatkovou tabulí "Mimo vozidel stavby", Z02.
Vyznačení objížďky pomocí značek IS11c, C3b. Objížďka bude vedena nejbližšími okolními ulicemi.
V nejbližších křižovatkách budou osazeny značky IP10a, IP10b, IP10C.
Úplná uzavírka, včetně délky trvání bude předem nahlášena IZS, včetně objízdné trasy.

Termín zvláštního užívání dle žádosti:

- úsek mezi čp. 45 a čp. 34 v délce cca 100 m: termín = od 08.08.2024 do 31.08.2024.

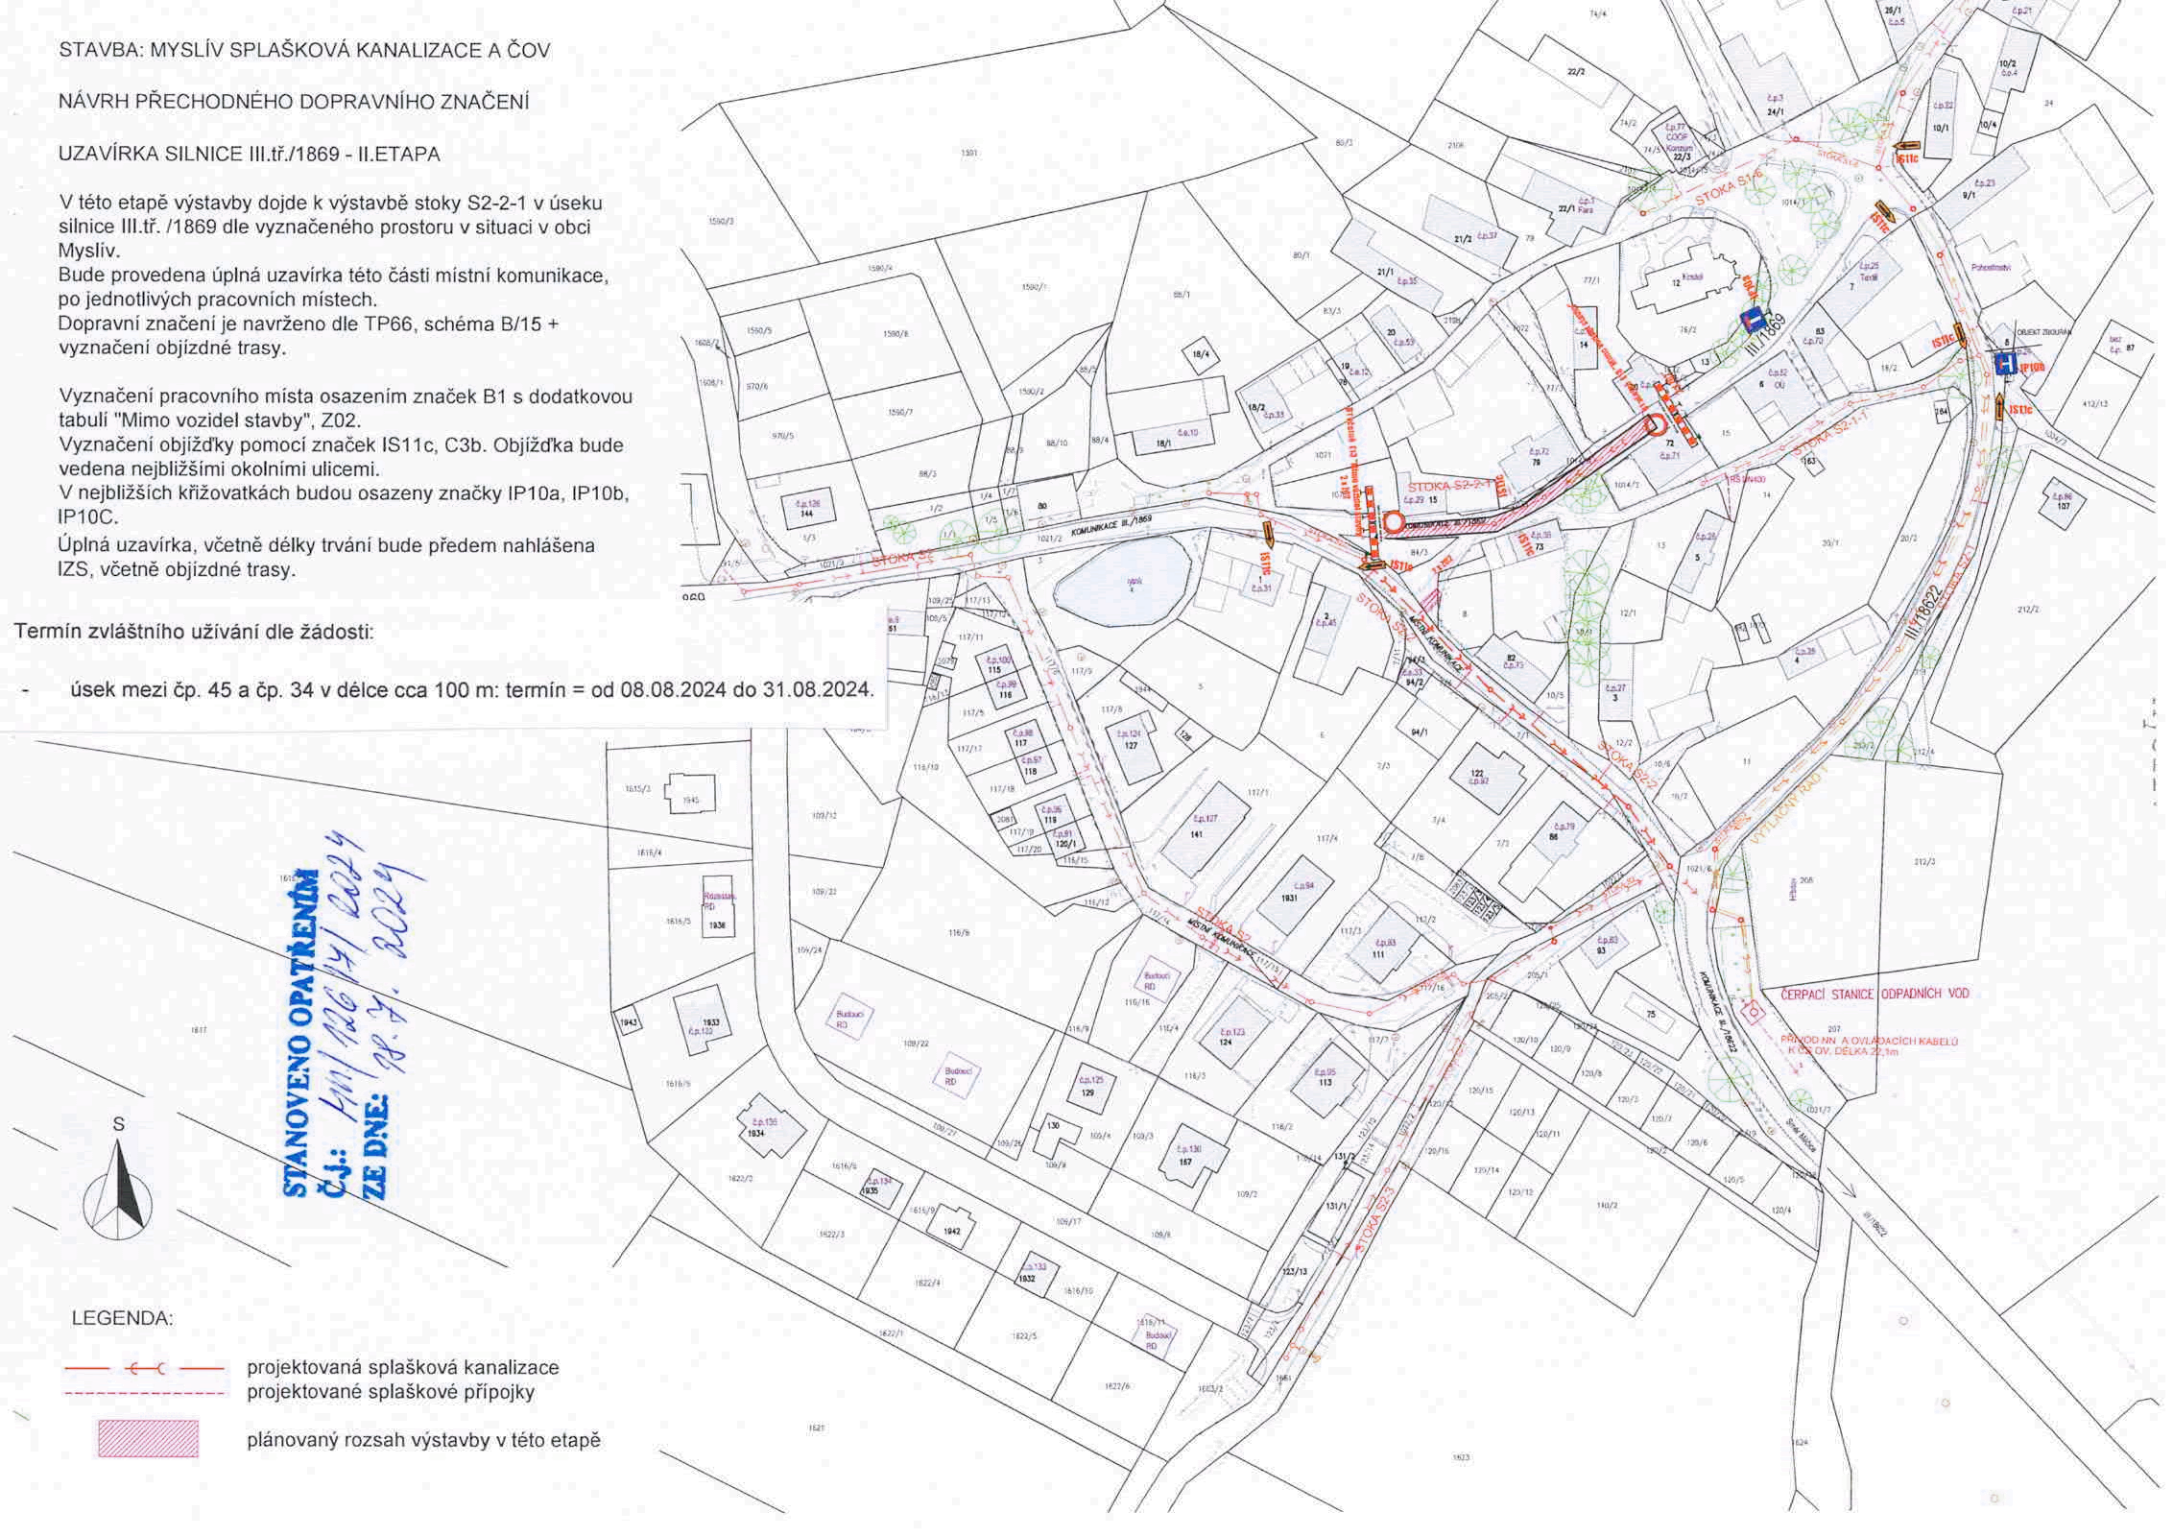

LEGENDA:

projektovaná splašková kanalizace
projektované splaškové přípojky

plánovaný rozsah výstavby v této etapě
